

## Verhuizing van de kunstcollectie:

**151.000** kunstwerken vanuit 5 externe depotlocaties naar Depot Boijmans Van Beuningen in 14-16 weken

**3,5 jaar** voorbereiding





## Voor de uithuizing prenten- en tekeningencollectie in 2019 is er 1,5 jaar voorbereid:

- Alle losliggende bladen in lades zijn voorzien van transportmappen
- Grote tekeningen zijn op rol in kokers geplaatst
- Er zijn dozen voor kwetsbare albums gemaakt



Enorme verbetering voor berging en conservering collectie werken op papier, maar ook voor vervoer bij collectieverhuizing



## Vorbereitung verhuizing prenten en tekeningen

Vervoer van de kwetsbare werken in Speciale climate turtles.

Voor de verhuizing van 2021 zijn alle dozen geseald.





## Vorbereiding verhuizing naar Depot – aanvang 2018 tot en met 2020

**Kleurcoderen – nieuwe standplaats in depot –  
op compartiment en objectniveau**



Alle 14 compartimenten hebben een eigen kleur

Indeling op **materiaal en formaat**





Inrichting Bruynzeel:

Statisch waar nodig  
Elektrisch verrijdbaar waar  
mogelijk





Creatieve oplossingen  
rond de dragende pilaren





Werken op hoogte





**Vorbereitung 2018-2020: schoonmaken (stof verwijderen / verbeteren verpakkingen)**







**Vorbereitung 2018-2020:**  
verbeteren verpakkingen collectiestukken / inlijstingen schilderijen








# Plan verhuizing naar “Depot BVB”

Geef het monster een naam en het wordt een vriendelijk dier.

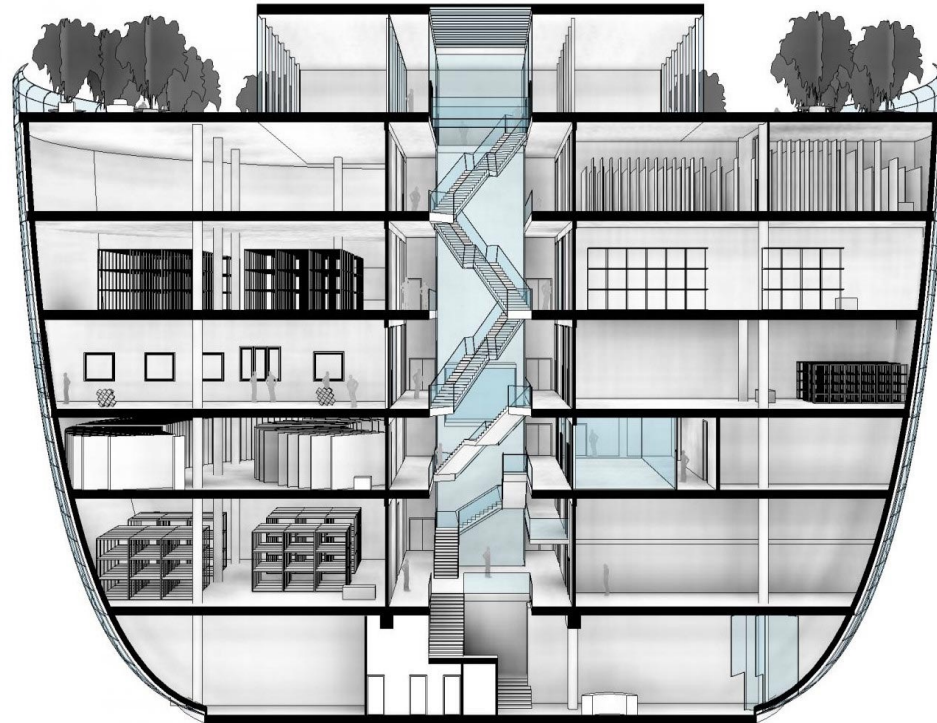


# Organisatie



**Vaste protocollen**

A diagram consisting of two boxes connected by a horizontal line. The box on the left is yellow with rounded corners and contains the text 'Vaste protocollen'. The box on the right is blue with sharp corners and contains the text 'Functies en verantwoordelijkheden'. A grey horizontal line connects the right side of the yellow box to the left side of the blue box.

**Functies en verantwoordelijkheden**

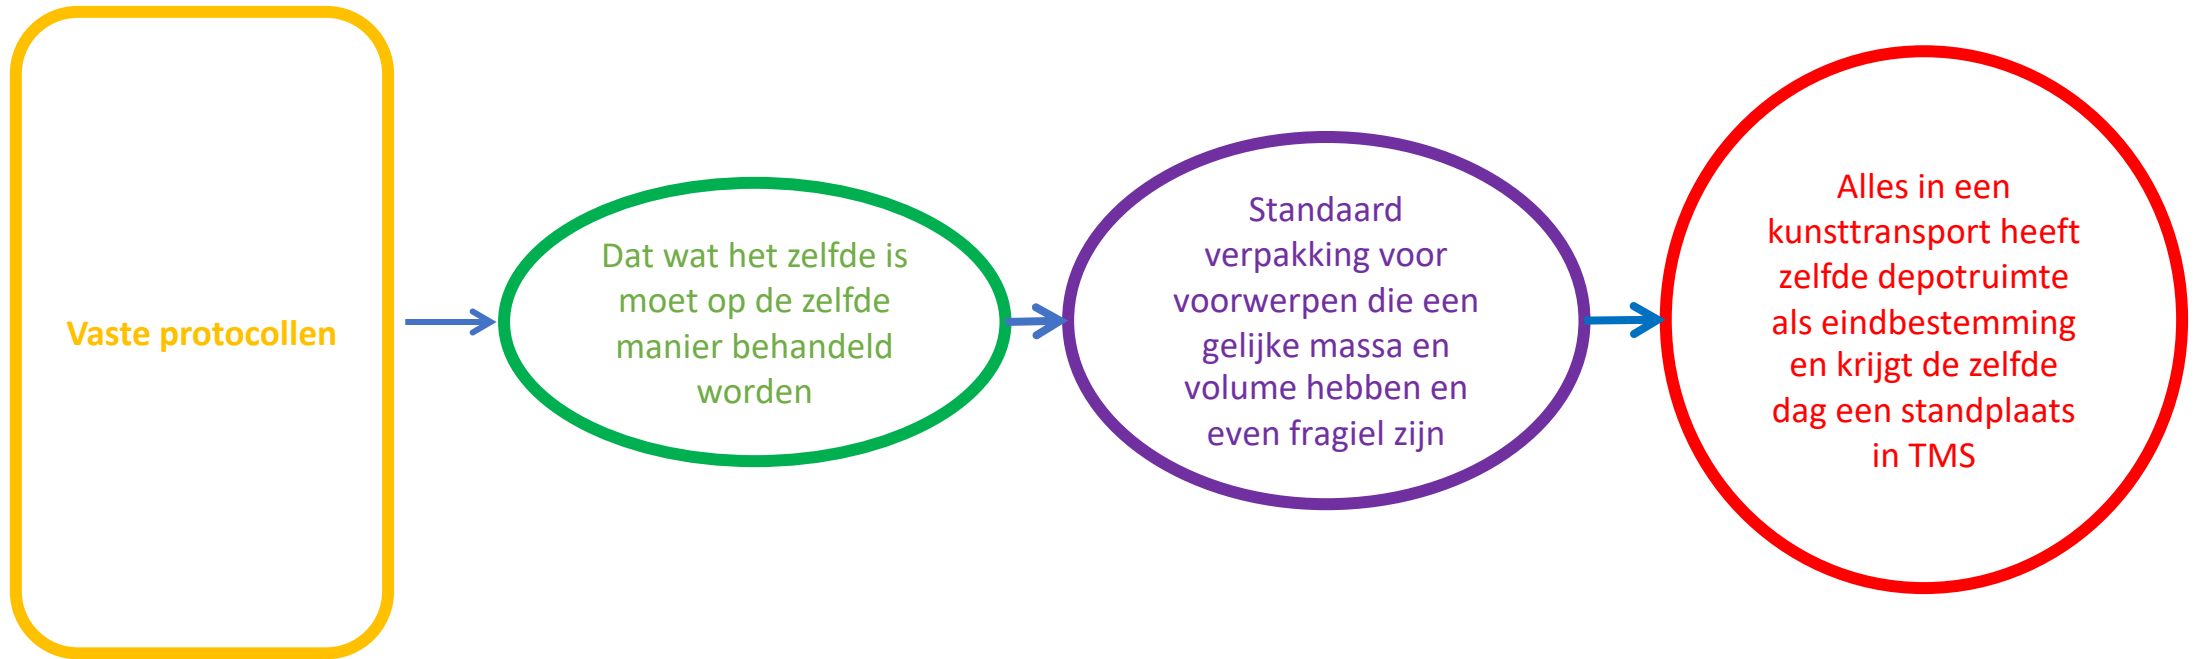



## Doel van het coderen van de collectie

- Voor de verhuizing kan bepaald worden of de hele collectie een standplaats in het Depot BVB kan krijgen
- Aan de hand van het standplaatsbestand kunnen bij de installatie van de stellingen in het nieuwe depot de planken op de juiste hoogte worden aangebracht en voorzien worden van een standplaatscode.
- Bij de verhuizing van de collectie kunnen vrachtauto's worden geladen met voorwerpen die de zelfde kleurcode hebben. Deze kleur correspondeert met de kleur die is toegekend aan een specifieke ruimte in het depot BVB.
- Alle voorwerpen kunnen rechtstreeks op hun van te voren bepaalde plek in het nieuwe depot worden geplaatst, omdat de planken in de stellingen al op de juiste hoogte zijn aangebracht.


Basis voor het toekennen  
van standplaatsen

Fysieke maten

Museale  
samenhang


Materiaal en  
klimaat



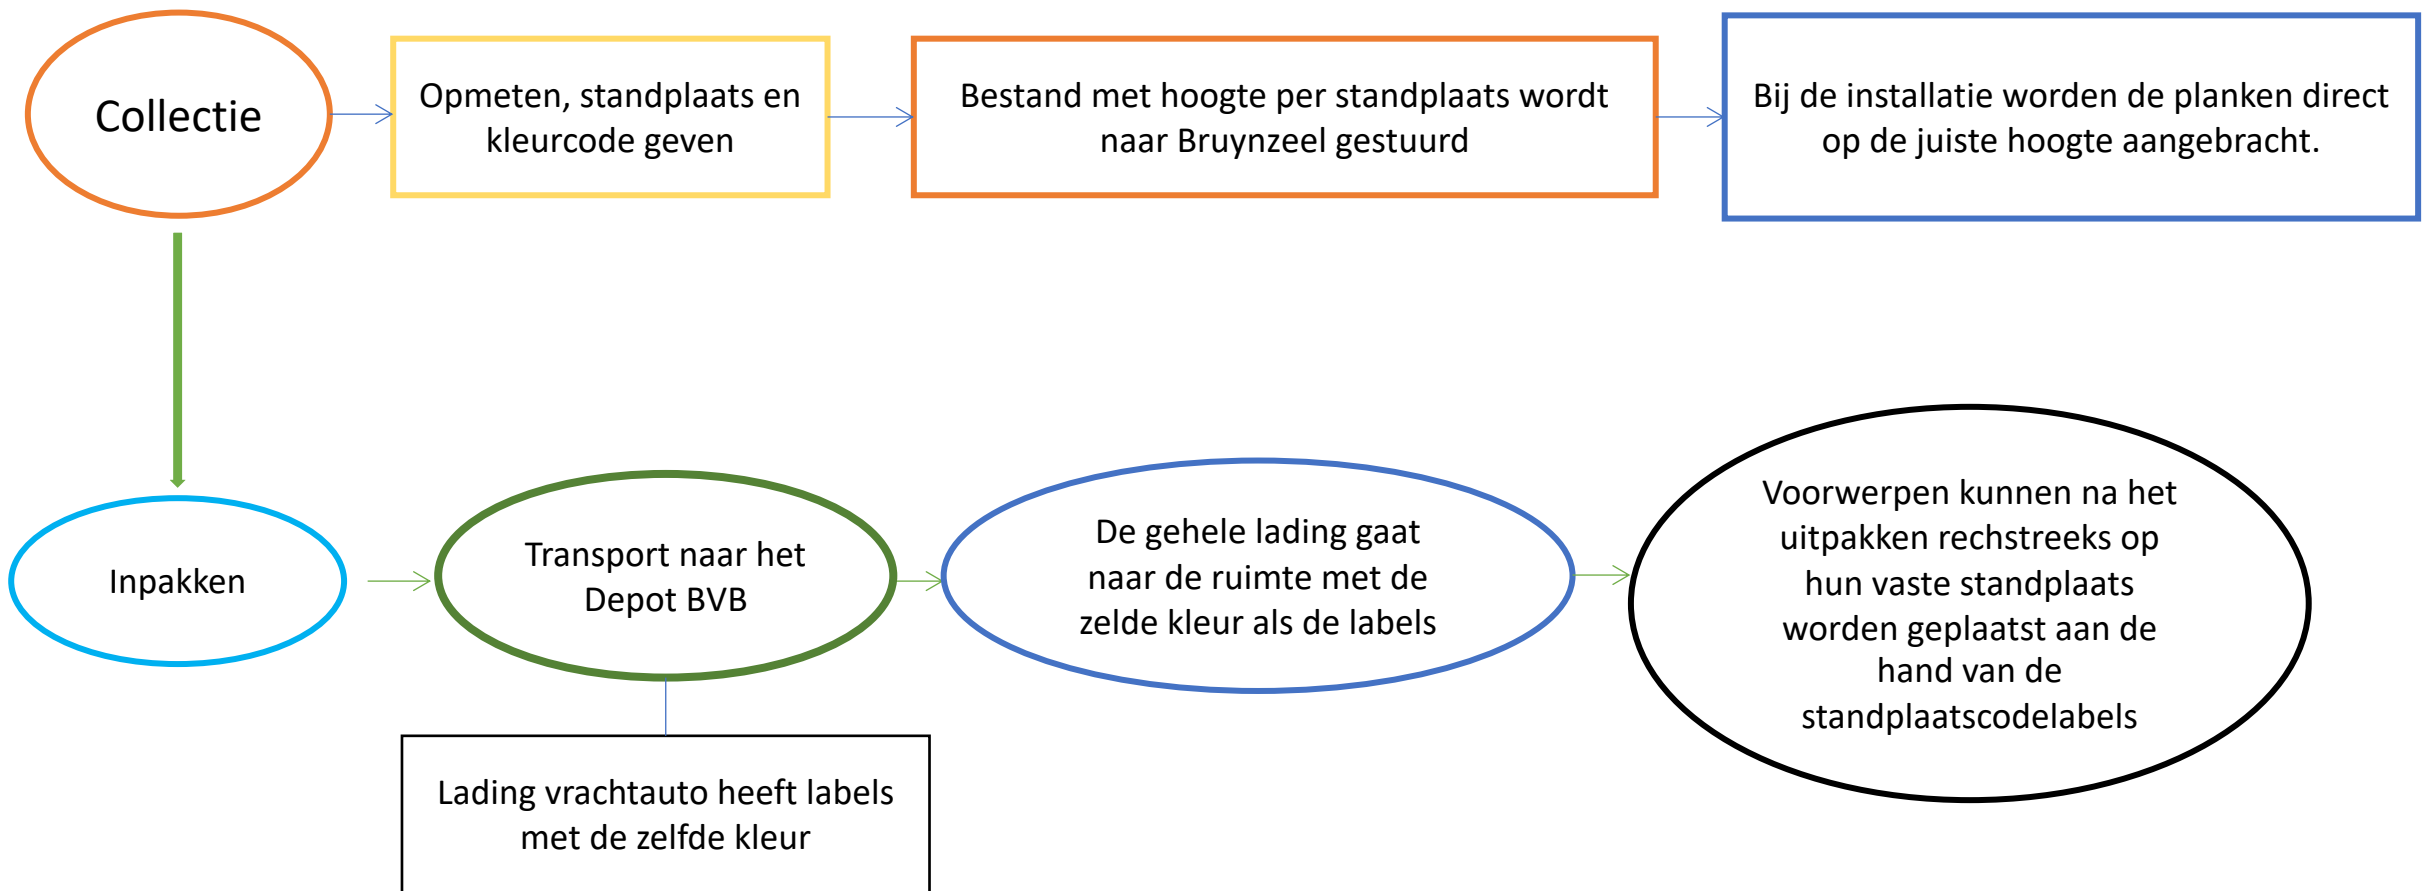

Transport 1  
Voorwerpen met  
rode labels

Transport 2  
Voorwerpen met  
blauwe labels

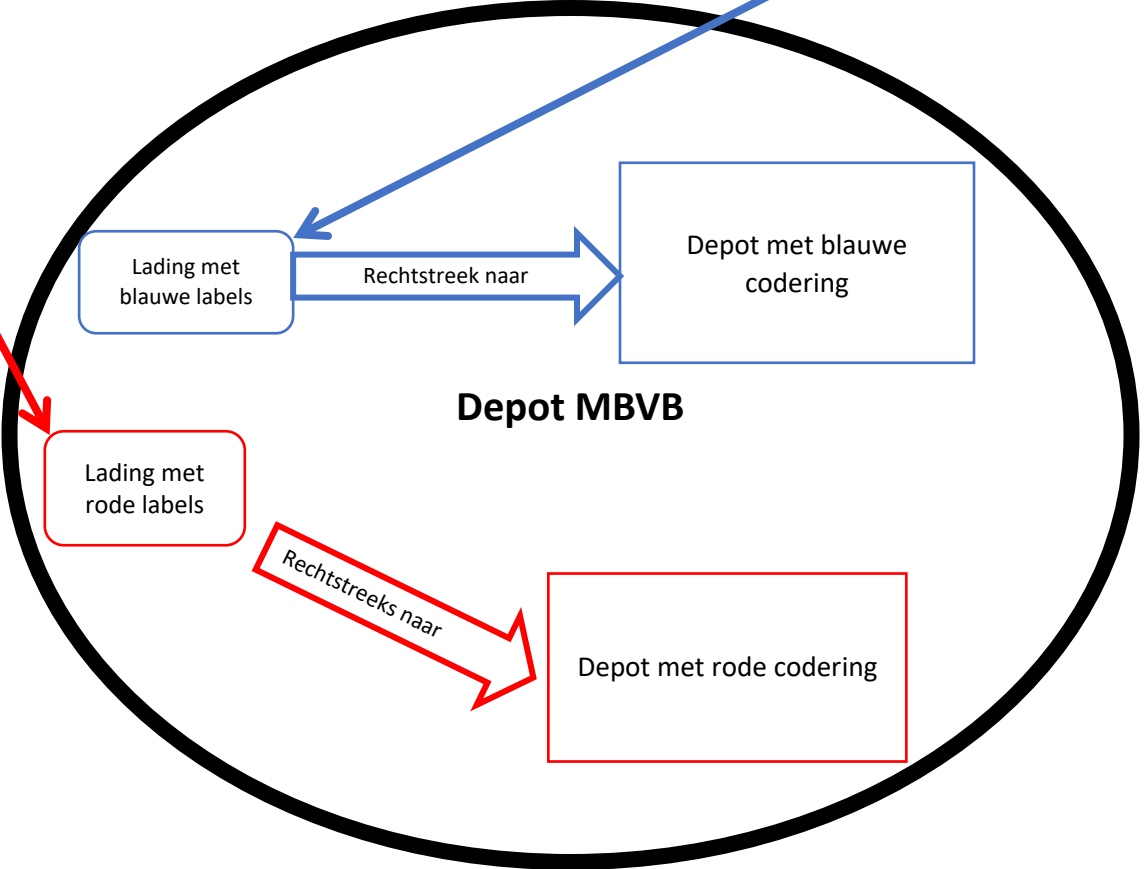

Lading met  
blauwe labels

Depot met blauwe  
codering


**Depot MBVB**

Lading met  
rode labels

Depot met rode codering

*Rechtstreeks naar*




Rechtstreek naar

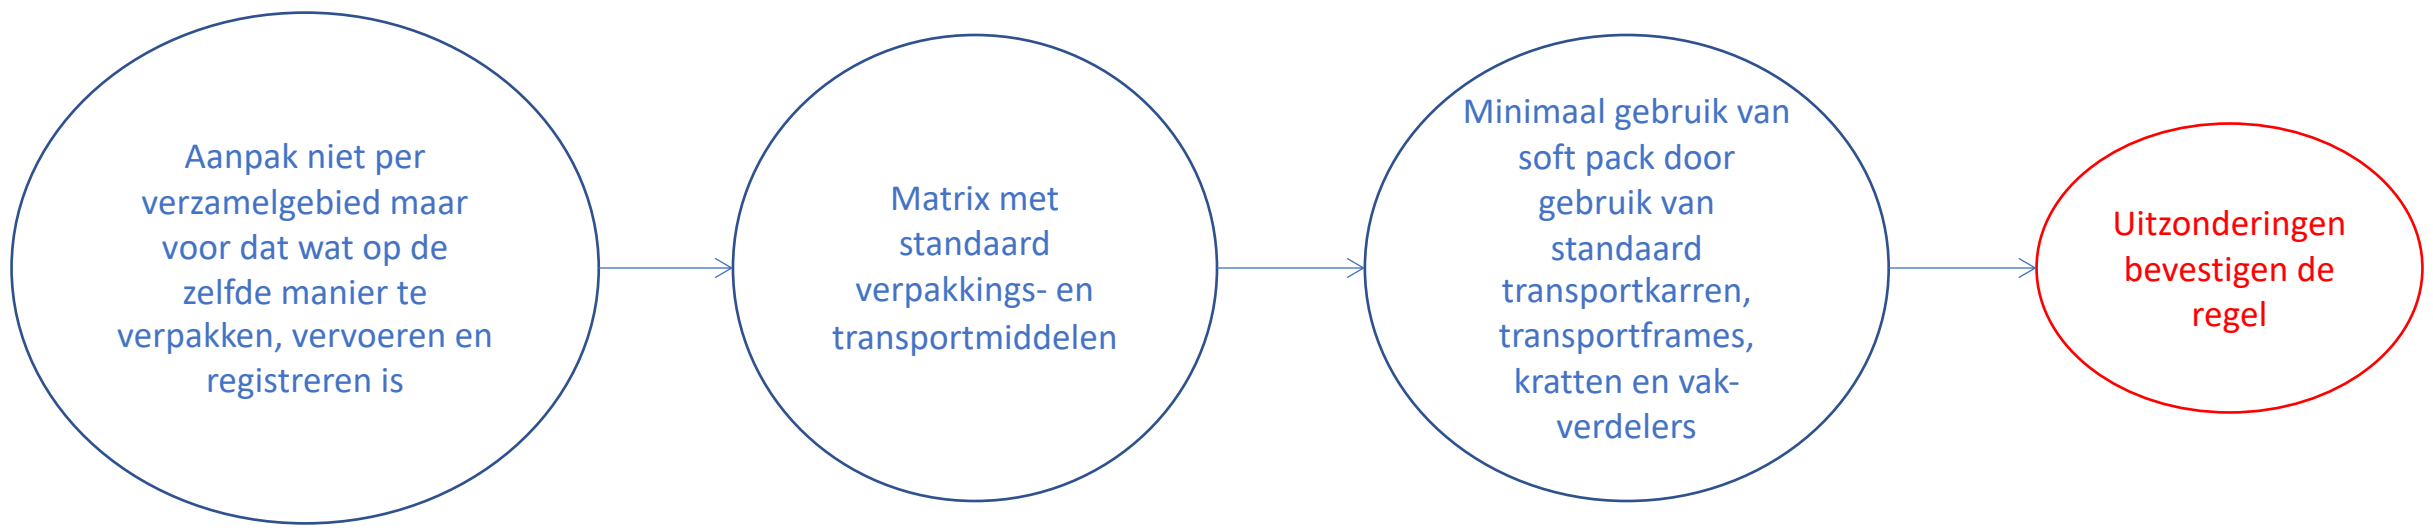



## standaard transportmiddelen

| Soort                        | Code | beschrijving   |
|------------------------------|------|--|
| verzamelkar                  | A    | grote gaaswandkar  |
| verzamelkar met schotten     | A-1  | grote gaaswandkar met in PE schuim beklede platen          |
| klimaatkist                  | B    | huurkist in variabele maten ( A,B,C,D )                    |
| schlilderijen kist museum    | B-1  | voor het object op maat gemaakte kisten                    |
| schilderijen/ platenkar      | C    | kar met een plateau en opbouw onder een hoek van 30 graden |
| transportframe               | D    | transportframe met variabele binnen maten                  |
| palletbak                    | E    | kunststof huurkrat 80cm/120cm                              |
| palletkrat met vlakverdeling | E-1  | kunststof huurkrat 80cm/120cm verdeelschotten              |
| palletkrat met opbouw        | E-2  | kunststof huurkrat 80cm/120cm steigerpijp opbouw           |
| PC- krat                     | F    | klein formaat huurkrat                                     |
| PC-krat met vakverdeling     | F-1  | klein formaat huurkrat met variabele verdeelschotten       |
| etagewagen                   | G    | transportkar met vijf etages + vier gesloten zijden        |
| Turtle klimaatwagen          | G-1  | huurwagen met klimaat isolatie + trilling reductie         |
| pallet                       | H    | van euro formaat tot op maat                               |

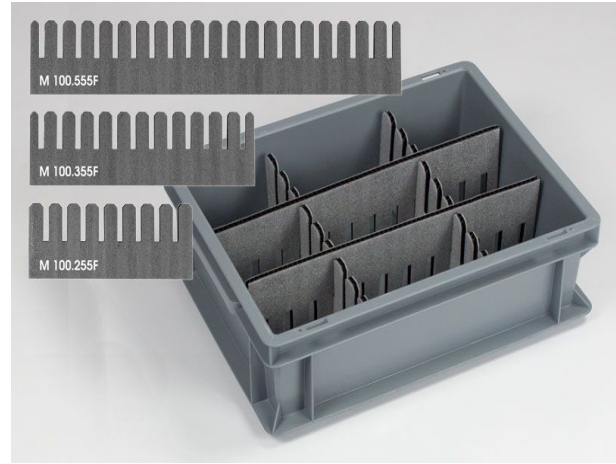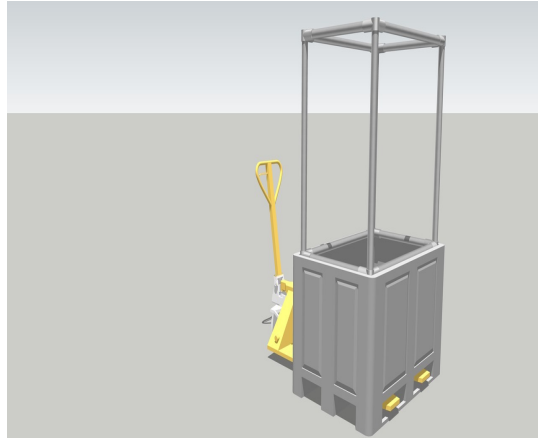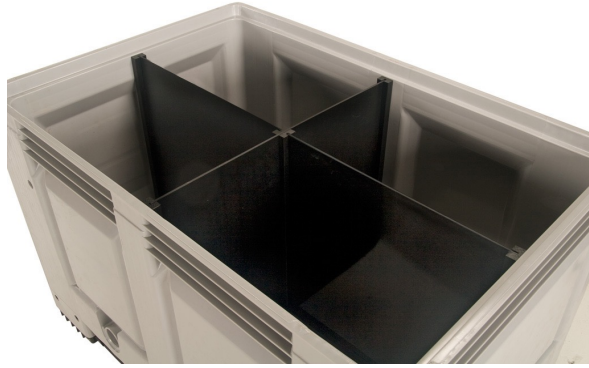





**Functies en  
verantwoordelijkheden**

**Centrale  
coördinatie**

**Coördinatie bij  
het inpakken**


**registratie**



## Bezetting tijdens de verhuizing

| Functie tijdens de verhuizing    | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag |
|----------------------------------|---------|---------|----------|-----------|---------|
| Behoudsmedewerkers/ art-handlers | 24      | 24      | 24       | 24        | 12      |
| registrators                     | 6       | 6       | 6        | 6         | 3       |

Coördinatie verhuizing uitgevoerd door medewerkers van museum BVB

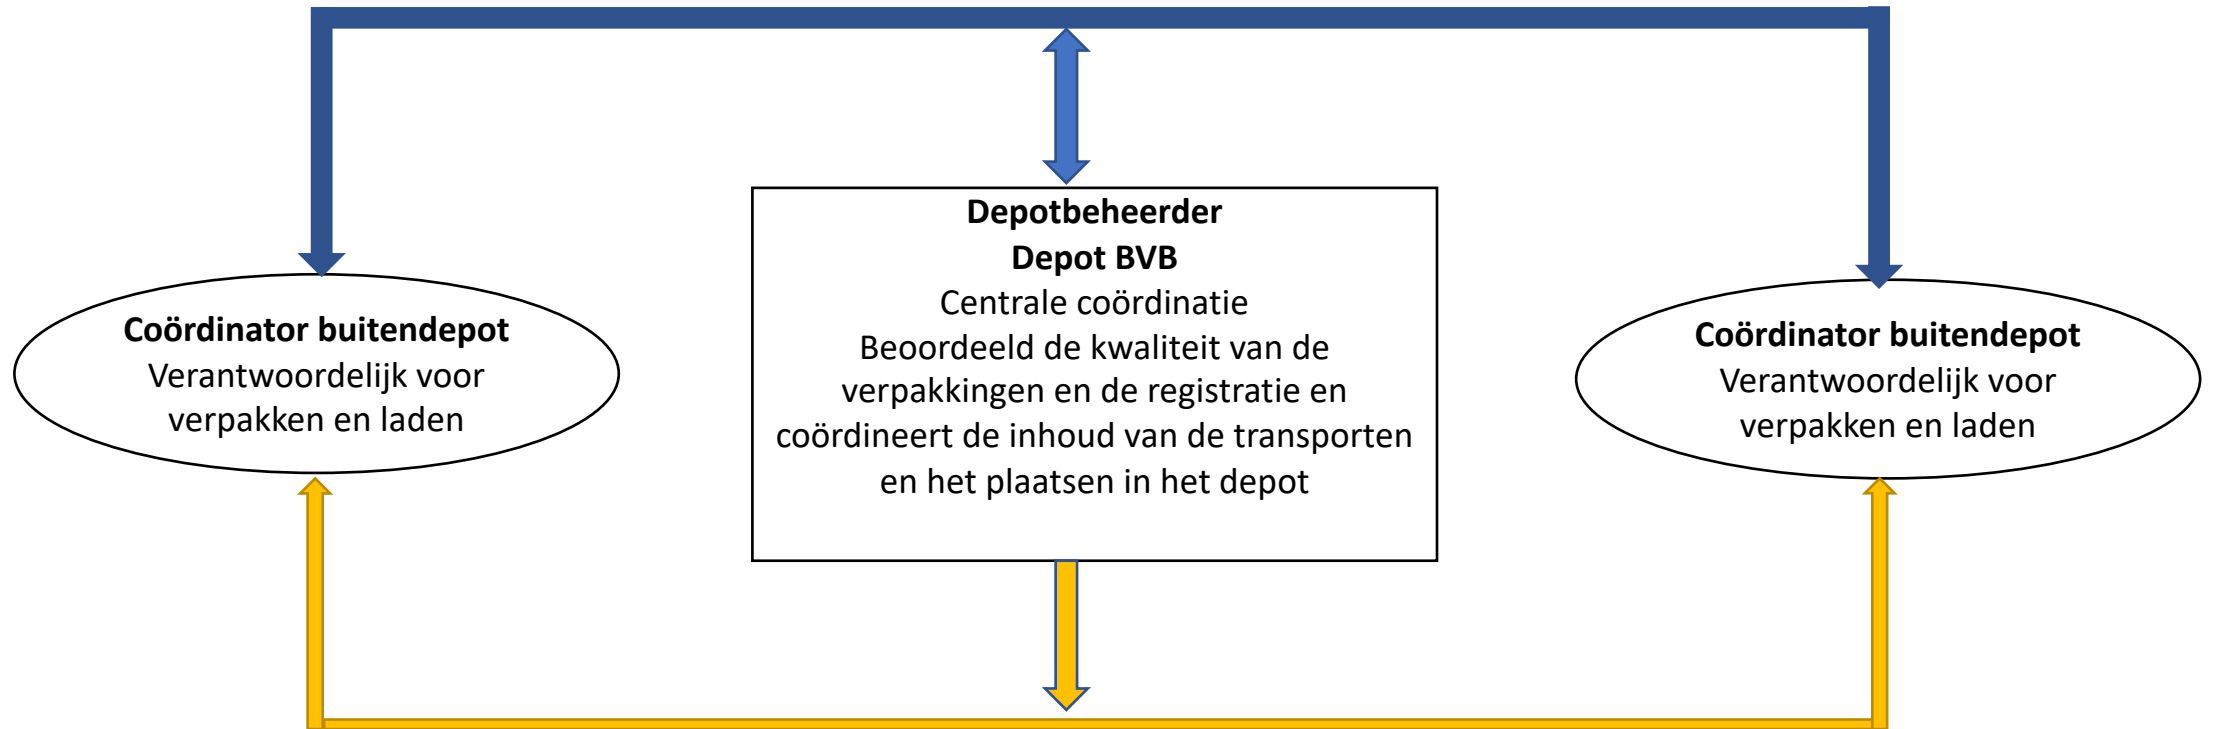

Communicatie over samenstelling ritten

Communicatie over kwaliteit van de verpakkingen



verpakken



Registratie verpakking  
(1 registrar per 4  
arhandlers)

Laden  
vrachtauto



Maken transportbon  
(1 registrar)


Plaatsen in  
depot



Registratie  
standplaatsen +  
invoer TMS  
(1 registrar per 4 art-  
handlers)




Verhuizing van maandag tot Donderdag naar "Depot BVB"

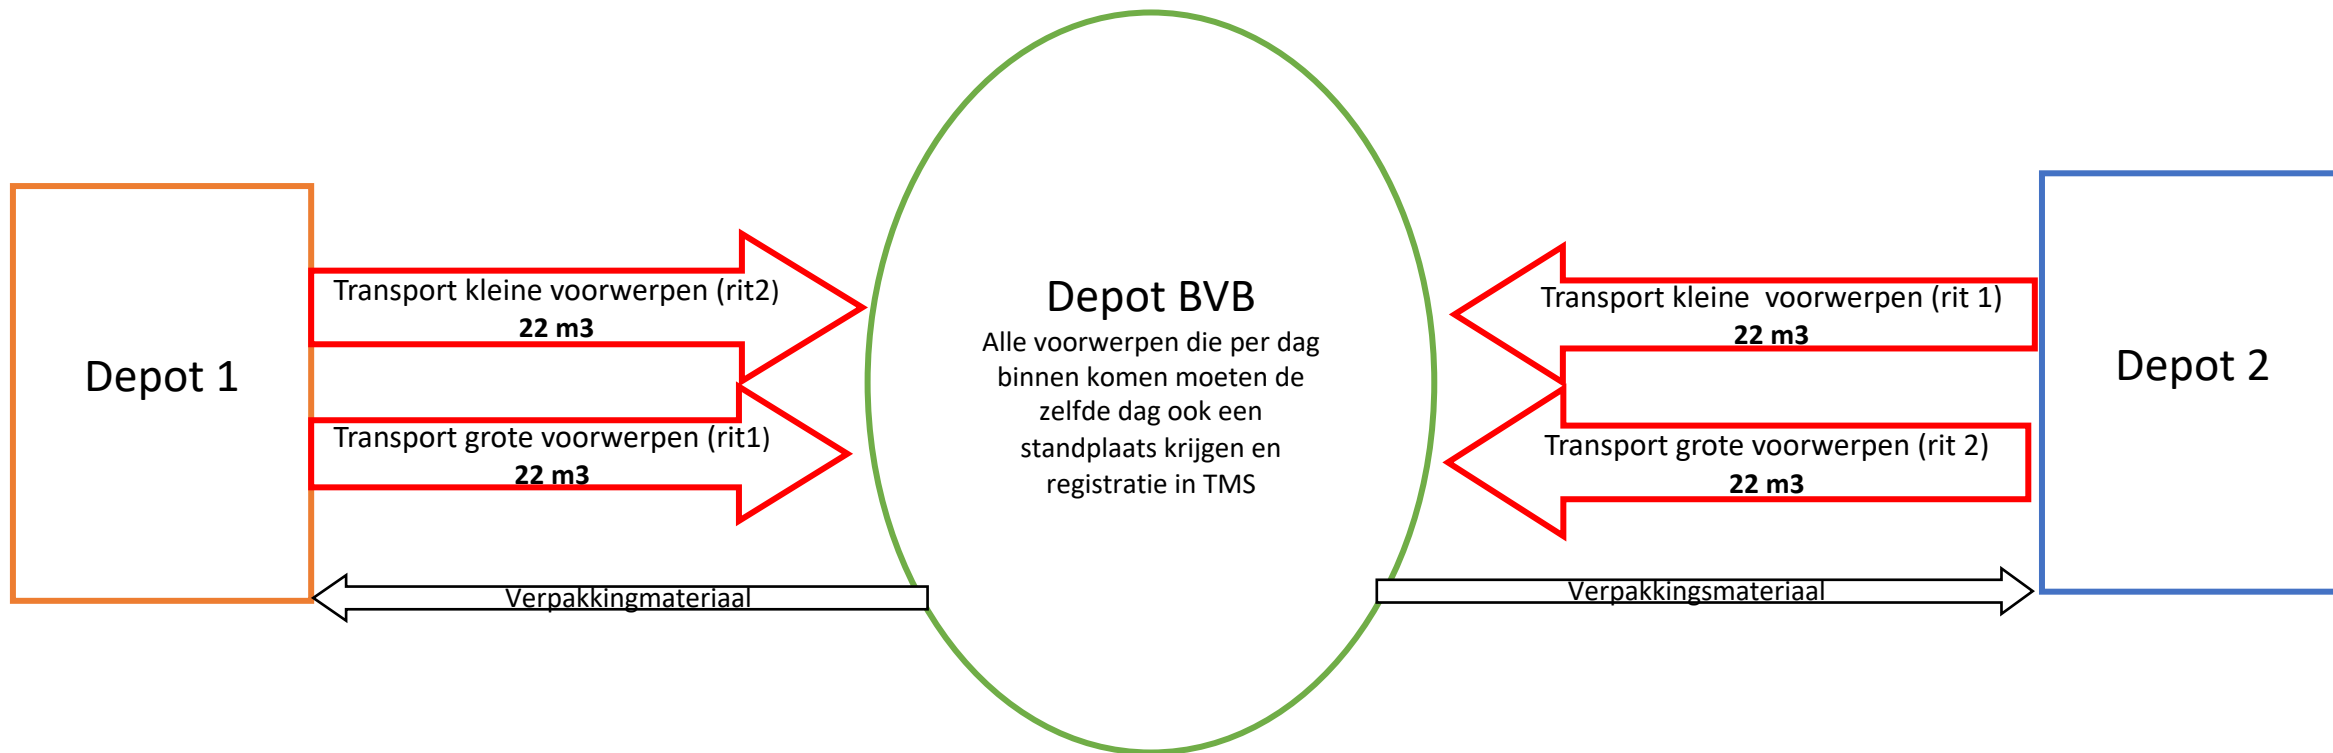

Elk transport wordt geladen met voorwerpen die het zelfde kleurlabel hebben.

Verhuizing op vrijdag naar "Depot BVB"

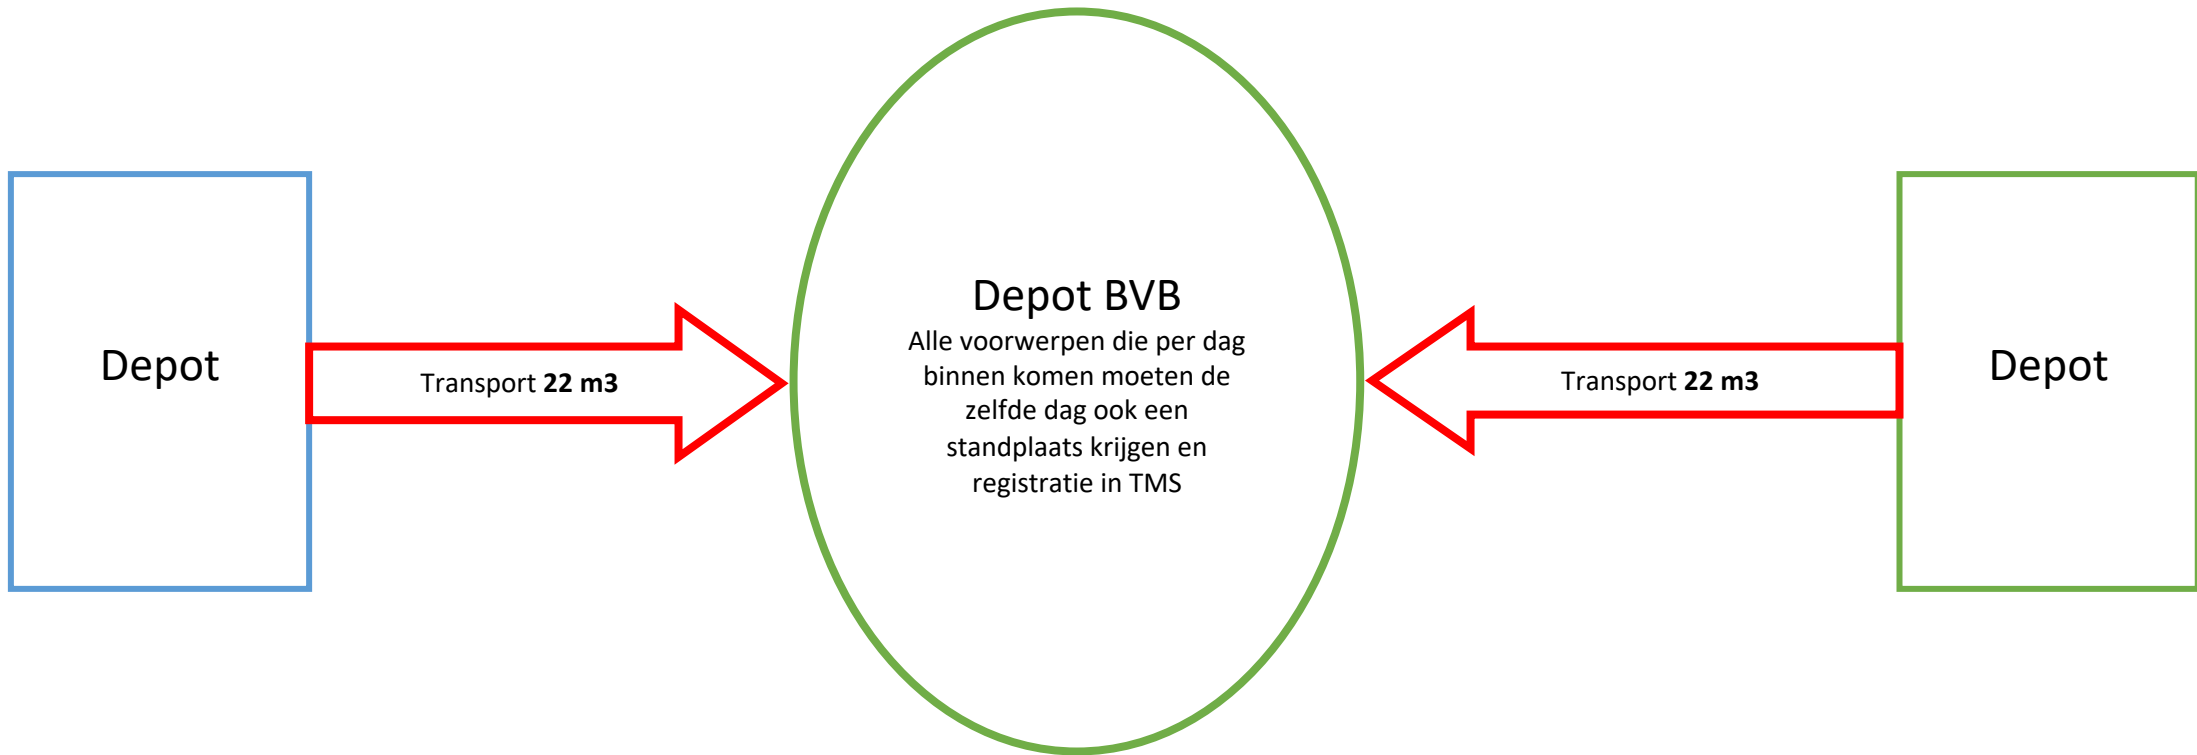

Dit is afgestemd op de helft van het volume van de andere dagen, om meer tijd vrij te maken voor speciale verpakkingen en zware buiten voormaats transporten

Totaal te verhuizen  
volume is 4500m<sup>3</sup>  
inclusief 20%  
verpakkingsmateriaal

Per week worden 18  
ritten van gemiddeld  
22m<sup>3</sup> vervoerd  
(396 m<sup>3</sup>)

Vertaling naar  
een  
verhuisperiode  
van 16 weken  
inclusief 2  
weken vakantie  
en 2 weken  
uitlooptijd



